



Businessplan

Erwerb und Entwicklung eines naturnahen Erlebnis-, Bildungs- und Begegnungshofes in Fliseryds-Boda, Mönsterås, Schweden

Erwerb und Entwicklung eines naturnahen Erlebnis-, Bildungs- und Begegnungshofes

GRÜNDER	Robert Walter & Anna Walter
STANDORT	Fliseryds-Boda, Mönsterås, Schweden
INVESTITIONSVOLUMEN	ca. 3.000.000 SEK
KREDITANFRAGE	≈ 2.000.000 SEK

Das war kein Urlaub, das war Freiheit.

INHALTSVERZEICHNIS

Struktur des Businessplans

01	Teil 1 – Executive Summary	7
	Projektübersicht	7
	Projektidee	8
	Geplante Nutzungen	8
	Offene Wissensplattform	10
	Gründerprofil	11
	Finanzierung & Umsetzung	12
	Gesellschaftlicher Mehrwert	12
02	Teil 2 – Gründerprofil, Haltung, Identität und die Geschichte hinter dem Projekt	13
	Die Menschen hinter dem Projekt	13
	Robert Walter – Handwerk als Ausdruck von Haltung	14
	Arbeitsverständnis und persönliche Haltung	14
	Natur als Grundlage des Projektes	16
	Anna Walter – Wissen, Gastfreundschaft und Gemeinschaft	16
	Wissen als gemeinschaftliche Ressource	17
	Das langfristige Ziel	18
03	Teil 3 – Standortanalyse, Grundstück, Gebäude und Entwicklungspotenzial	19
	Ausgangslage	19
	Standortanalyse – Warum dieser Ort geeignet ist	20
	Grundstücksanalyse – Die 5,3 Hektar	21
	Gebäudeanalyse	22
	Infrastrukturstrategie	23
	Entwicklungsstrategie	24
	Bewertung aus Unternehmenssicht	25
04	Teil 4 – Geschäftsmodell, Angebotsstruktur und Einnahmequellen	27
	Geschäftsmodell – Was wird tatsächlich verkauft?	27
	Grundstruktur des Geschäftsmodells	28
	Wirtschaftliche Logik	32

	Saisonstrategie	33
	Zielgruppenstrategie	33
	Abgrenzung – Was dieser Ort bewusst nicht ist	35
	Langfristige wirtschaftliche Vision	35
05	Teil 5 – Zielgruppenanalyse, Positionierung und Marktstrategie	36
	Grundsatz – Für wen entsteht dieser Ort?	36
	Positionierung des Projektes	36
	Hauptzielgruppen	37
	Internationale Ausrichtung	40
	Preisstrategie	41
	Marketingstrategie	42
	Markenidentität	42
	Was Gäste später erzählen sollen	43
06	Teil 6 – Rechtliche Struktur, Genehmigungen und Umsetzung in Schweden	44
	Grundsatz	44
	Ausgangslage der Immobilie	45
	Empfohlene Unternehmensentwicklung	45
	Baurechtliche Strategie	46
	Wasser und Abwasser	47
	Backhaus – Lebensmittelrecht	48
	Schmiede – Sicherheit und Betrieb	48
	Veranstaltungen und externe Anbieter	49
	Versicherungsstrategie	49
	Risiko- und Genehmigungsstrategie	50
	Grundsatz für alle Entscheidungen	50
07	Teil 7 – Bauphasen, Investitionsplanung und Umsetzungsstrategie (Jahr 1–10)	51
	Grundsatz der Entwicklung	51
	Investitionsstrategie	52
	Phase 1 – Erwerb & Funktionsfähigkeit	52
	Phase 2 – Rundhaus & Begegnung	54
	Phase 3 – Backhaus & Schmiede	55
	Phase 4 – Gästehäuser	57

	Phase 5 – Konsolidierung & Wachstum	58
	Ergebnis Phase 5	58
	Investitionslogik	59
	Umgang mit Risiken	59
	Ziel nach 10 Jahren	60
08	Teil 8 – Finanzplanung, Wirtschaftlichkeit und bankfähige Kreditstrategie	61
	Ziel der Finanzplanung	61
	Ausgangslage	61
	Finanzierungsmodell	62
	Investitionsplanung (erste Entwicklungsstufen)	62
	Eigenleistung als wirtschaftlicher Faktor	64
	Einnahmen – Phase 1 (Jahr 1)	64
	Einnahmen – Phase 2–3 (Jahr 2–4)	65
	Einnahmen – Zielbetrieb (Jahr 5–10)	66
	Kostenstruktur	66
	Liquiditätsstrategie	67
	Kreditstrategie (Bankversion)	67
	Bankargumentation	68
09	Teil 9 – Risikoanalyse, Fördermöglichkeiten und Handlungssicherheit	69
	Grundsatz	69
	Projektrisiken – Übersicht	69
	Finanzierungsrisiko	70
	Genehmigungsrisiko	71
	Bau- und Sanierungsrisiko	72
	Wasser- und Abwasserrisiko	72
	Tourismus- und Auslastungsrisiko	73
	Persönliches Risiko	74
	Risiko der Identitätsveränderung	75
	Fördermöglichkeiten (Strategische Betrachtung)	75
	Handlungssicherheit	77
	Drei Notfallstufen	77
	Gesamtbewertung	78

10	Teil 10 – Umsetzung, Markenaufbau, Marketing und 5-Jahres-Entwicklungsplan	79
	Grundsatz	79
	Die Marke – Was Menschen erleben sollen	79
	Markenversprechen	81
	Kommunikationsstrategie	81
	Social-Media-Strategie	83
	Kooperationen	84
	Gästereise (idealer Ablauf)	84
	Der Aufbau als Entwicklungsreise (5 Jahre)	85
	Erfolgsmessung	87
	Langfristiges Bild	87
11	Teil 11 – Langfristige Vision, Lebensmodell und Schlussbetrachtung	88
	Warum dieses Projekt entsteht	88
	Das langfristige Lebensmodell	88
	Die Rolle der Arbeit	89
	Die Rolle der Familie	89
	Die Rolle der Gäste	90
	Die Rolle der Region	91
	Langfristige Entwicklung des Betriebes	91
	Grenzen des Wachstums	92
	Erfolg – Wie Erfolg definiert wird	92
	Das Bild nach zehn Jahren	93
	Schlusswort	93
A	Anhang	94
A	Anhang A – Finanzübersicht	94
A	Anhang B – Investitionsübersicht	94
A	Anhang C – Zeitplan	96
A	Anhang D – Grundrissidee / Funktionsbereiche	96
A	Anhang E – Organigramm	98

Dokument	Bankversion des Businessplans
Gründer	Robert Walter & Anna Walter
Standort	Fliseryds-Boda, Mönsterås, Schweden
Investitionsvolumen	ca. 3.000.000 SEK
Kreditanfrage	≈ 2.000.000 SEK
Stand	30. Mai 2026

Teil 1 – Executive Summary

Projektübersicht

Robert Walter und Anna Walter planen den Erwerb und die schrittweise Entwicklung eines bestehenden Hofes in Fliseryds-Boda, Gemeinde Mönsterås, Schweden.

Auf einem Grundstück mit ca. 5,3 Hektar Fläche mit bestehendem Wohnhaus, einem weit fortgeschrittenen Ferienhaus, Stall-/Scheunengebäuden sowie Freiflächen entsteht langfristig ein naturnaher Erlebnis-, Bildungs- und Begegnungshof.

Das Projekt verfolgt bewusst nicht das Ziel eines klassischen Tourismusbetriebs.

Stattdessen entsteht ein Ort, an dem:

- Menschen Erholung und Freiheit erleben
- Wissen weitergegeben wird
- Handwerk erhalten und vermittelt wird
- Begegnung zwischen Gästen und Einheimischen entsteht
- Natur aktiv erlebt wird
- Gemeinschaft freiwillig wachsen darf

Das Projekt richtet sich ausdrücklich an:

- Einheimische
- Familien
- schwedische Gäste
- internationale Besucher
- Naturinteressierte
- Handwerksinteressierte
- Menschen mit Interesse an einfachem und bewusstem Leben

Leitgedanke:

„Das war kein Urlaub, das war Freiheit.“

Projektidee

Der Hof wird in mehreren Entwicklungsphasen aufgebaut.

Die Entwicklung erfolgt bewusst wirtschaftlich vorsichtig und mit hohem Eigenleistungsanteil.

Der Schwerpunkt liegt auf:

- niedriger Anfangsbelastung
- schneller Nutzbarkeit
- schrittweisem Ausbau
- langfristiger Tragfähigkeit

Geplante Nutzungen

Übernachtung & Aufenthalt

Kurzfristig:

- Fertigstellung des bestehenden Ferienhauses

Langfristig:

- Errichtung von 4 bis 5 kleinen Gästehäusern
- ganzjährige Nutzung
- gemeinsames Sanitär- und Duschhaus
- naturnahe Unterbringung

Ausstattung:

- Strom
- Dämmung
- Heizung
- fließendes Wasser
- kleine Kochmöglichkeiten

Kapazität:

ca. 10 bis 15 Übernachtungsgäste

Positionierung:

erschwingliches Erlebnis statt Luxusangebot.

Rundhaus – Zentrum des Hofes

Geplant:

- traditioneller Holzbau
- ca. 15 Meter Durchmesser
- offene Feuerstelle mit Rauchfang
- kleine Küche
- Tische und Bänke
- ganzjährige Nutzung

Nutzung:

- Begegnungsort
- Workshops
- gemeinsames Essen
- Kulturveranstaltungen
- Hochzeiten
- Wissensvermittlung
- saisonale Veranstaltungen

Keine Übernachtung.

Schmiede – Handwerk & Erfahrung

Unter Leitung von Robert Walter entsteht eine Schmiede.

Angebote:

- Schmiedekurse
- Einsteigerworkshops
- Auftragsarbeiten
- Verkauf handgefertigter Produkte
- Onlinehandel
- offene Werkstattformate

Backhaus – Handwerk & Gemeinschaft

Unter Leitung von Anna Walter entsteht ein Backhaus.

Angebote:

- Backkurse
- Kochangebote
- Brotproduktion
- Verkaufstage
- Hofverkauf

Ganzjahresbetrieb.

Der Fokus liegt auf:

- niedrigschwelligen Angeboten
- Familienfreundlichkeit
- regionaler Offenheit

Offene Wissensplattform

Der Hof wird bewusst nicht ausschließlich durch eigene Angebote betrieben.

Neben den eigenen Angeboten von Robert und Anna Walter sollen externe Kursanbieter, Handwerker, Künstler, Naturpädagogen, Kreative und Fachpersonen die Möglichkeit erhalten, die Infrastruktur des Hofes zu nutzen, um ihr Wissen an andere Menschen weiterzugeben.

Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem Wissen frei weitergegeben werden kann.

Mögliche Formate:

- Handwerkskurse
- Naturbildung
- Kreativangebote
- Familienprogramme
- Kulturveranstaltungen
- Gesundheitsangebote
- saisonale Programme
- Seminare
- gemeinschaftliche Lernformate

Der Hof versteht sich nicht als reine Veranstaltungsfläche.

Er soll eine offene Plattform für Begegnung, Austausch und Entwicklung werden.

Gründerprofil

GRÜNDERPROFILE	
Robert Walter Berufliche Kompetenzen: • Landschaftsgärtner • Stukkateur • Zimmererfahrung • Schmied • umfangreiche handwerkliche Eigenleistung Rolle: • Bau • Entwicklung • Infrastruktur • Schmiede • Projektsteuerung Eigenleistung: 40 bis 60 Stunden pro Woche. Bei Bedarf zusätzliche externe Tätigkeit zur Sicherung der Liquidität.	Anna Walter Berufliche Kompetenzen: • Köchin • Fachberaterin für Säuglings- und Kinderernährung • Gastronomie • Kursleitung • Selbstständigkeit Bestehendes Einkommen bleibt während der Aufbauphase erhalten. Rolle: • Backhaus • Kurse • Gäste • Lebensmittelangebote

Finanzierung & Umsetzung

Geplanter Erwerb:

ca. 950.000 SEK

Geschätzter Gesamtinvestitionsbedarf erste Entwicklungsstufen:

ca. 3.000.000 SEK

Finanzierungsmodell:

- gestufte Finanzierung
- Eigenleistungen
- Fördermittel
- organisches Wachstum

Priorität Phase 1:

- Kauf
- Brunnen (Endausbau)
- Abwasser (Endausbau)
- Ferienhaus fertigstellen
- erste Einnahmen

Gesellschaftlicher Mehrwert

Das Projekt verfolgt nicht ausschließlich wirtschaftliche Ziele.

Es soll:

- Wissen zugänglich machen
- Menschen verbinden
- Natur erfahrbar machen
- Handwerk erhalten
- kulturellen Austausch fördern
- Raum für Entwicklung schaffen
- Einheimische und Gäste zusammenbringen

Langfristiges Ziel:

Ein Ort, an dem Menschen ankommen, sich entfalten und freiwillig Teil einer Gemeinschaft werden.

Teil 2 – Gründerprofil, Haltung, Identität und die Geschichte hinter dem Projekt

Die Menschen hinter dem Projekt

Dieses Projekt entstand nicht aus dem Wunsch, einen Tourismusbetrieb aufzubauen.

Es entstand aus dem Wunsch, einen Ort zu schaffen, der Bestand haben darf.

Robert Walter und Anna Walter verfolgen mit diesem Vorhaben nicht das Ziel, möglichst viele Menschen zu erreichen, sondern einen Ort entstehen zu lassen, der für diejenigen, die ihn besuchen, Bedeutung haben kann.

Der Hof soll wirtschaftlich tragfähig sein.

Gleichzeitig soll er ein Ort bleiben, an dem:

- gearbeitet wird
- gelernt wird
- Wissen geteilt wird
- Menschen willkommen sind
- Natur nicht nur betrachtet, sondern erlebt wird

Die Entwicklung erfolgt bewusst schrittweise.

Nicht durch maximale Investition.

Sondern durch Aufbau, Eigenleistung und langfristige Verantwortung.

Robert Walter – Handwerk als Ausdruck von Haltung

Robert Walter bringt umfangreiche praktische Erfahrung mit.

Beruflicher Hintergrund:

- Landschaftsgärtner
- Stukkateur
- Erfahrung im Zimmererhandwerk
- Schmied
- umfassende handwerkliche Eigenleistung

Die Grundlage seiner Arbeit liegt jedoch nicht ausschließlich im Handwerk.

Der Arbeitsansatz basiert auf Beobachtung, Verständnis und dem bewussten Umgang mit vorhandenen Strukturen.

Nicht alles muss ersetzt werden.

Nicht alles muss neu entstehen.

Der erste Schritt ist zu verstehen, was bereits da ist.

Dieser Gedanke prägt sowohl den Umgang mit Gebäuden als auch mit Landschaft und Menschen.

Die Entwicklung des Hofes erfolgt deshalb nicht gegen den Ort, sondern gemeinsam mit seinen Möglichkeiten.

Arbeitsverständnis und persönliche Haltung

Für Robert Walter ist Arbeit nicht ausschließlich Herstellung.

Arbeit bedeutet Gestaltung.

Nicht im Sinne von Kontrolle, sondern im Sinne von Verantwortung.

Ziel ist nicht, etwas zu bauen, das kurzfristig beeindruckt.

Ziel ist, etwas zu erschaffen, das:

- ehrlich ist
- Sinn besitzt
- Bestand haben darf

Diese Haltung zeigt sich in mehreren Grundprinzipien.

Handwerkliche Tiefe

Material wird nicht nur funktional betrachtet.

Es wird verstanden, verarbeitet und respektiert.

Wahrnehmung und Aufmerksamkeit

Die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, Stimmungen wahrzunehmen und mit vorhandenen Bedingungen zu arbeiten, ist zentraler Bestandteil der Arbeitsweise.

Dies gilt gleichermaßen für:

- Bau
- Natur
- Zusammenarbeit
- Gäste
- Entwicklung des Ortes

Verantwortung ohne Überhöhung

Menschen sollen nicht gelenkt oder geformt werden.

Ziel ist es, Räume zu schaffen, in denen Menschen ihre eigenen Erfahrungen machen können.

Dafür braucht es:

- Vertrauen
- Geduld
- Verlässlichkeit
- Offenheit

Qualität statt Perfektion

Hohe Ansprüche an die eigene Arbeit sind Teil des Projektes.

Nicht aus dem Wunsch nach Kontrolle.

Sondern aus dem Anspruch, dem gerecht zu werden, was als gute und ehrliche Arbeit verstanden wird.

Natur als Grundlage des Projektes

Natur ist nicht Dekoration.

Sie ist Grundlage.

Der Hof entsteht aus der Überzeugung heraus, dass Natur Orientierung geben kann.

Nicht durch Rückzug.

Sondern durch Verbindung.

Daraus entstehen die Grundwerte des Projektes:

- Nachhaltigkeit
- Echtheit
- Respekt gegenüber Material
- respektvoller Umgang mit Landschaft
- langfristiges Denken
- bewusste Entwicklung

Der Ort soll deshalb nicht künstlich wirken.

Er soll gewachsen wirken.

Anna Walter – Wissen, Gastfreundschaft und Gemeinschaft

Anna Walter ergänzt das Projekt um den Bereich Ernährung, Gastlichkeit und Wissensvermittlung.

Beruflicher Hintergrund:

- Köchin
- Fachberaterin für Säuglings- und Kinderernährung
- Gastronomieerfahrung
- Erfahrung in Kursleitung
- Erfahrung in Selbstständigkeit
- bestehende Tätigkeit im Backbereich in Schweden

Das Backhaus ist dabei nicht als gastronomischer Schwerpunkt gedacht.

Es soll ein Ort werden, an dem Menschen:

- miteinander arbeiten
- gemeinsam lernen
- Erfahrungen teilen
- einfache Dinge wieder bewusst erleben

Backen wird nicht als Dienstleistung verstanden.

Sondern als gemeinschaftliches Erlebnis.

Wissen als gemeinschaftliche Ressource

Ein zentraler Bestandteil des Projektes ist die Überzeugung:

Wissen gewinnt an Wert, wenn es geteilt wird.

Deshalb sollen nicht nur eigene Angebote entstehen.

Der Hof wird bewusst so entwickelt, dass auch:

- externe Kursanbieter
- Handwerker
- Künstler
- Naturpädagogen
- Kreative
- Fachpersonen

den Ort nutzen können.

Nicht als Mieter einer Eventfläche.

Sondern als Mitgestalter einer offenen Lernkultur.

Menschen sollen dort:

- lehren
- lernen
- ausprobieren
- weitergeben

Das langfristige Ziel

In zehn Jahren soll der Hof nicht an seiner Größe gemessen werden.

Sondern an seiner Wirkung.

Ein erfolgreicher Hof ist für die Gründer ein Ort:

- an dem die Familie gerne lebt
- an dem Arbeit Freude macht
- an dem Menschen sich begegnen
- an dem Wissen weitergegeben wird
- an dem Natur erlebbar bleibt
- an dem Freiheit spürbar wird

Teil 3 – Standortanalyse, Grundstück, Gebäude und Entwicklungspotenzial

Ausgangslage

Geplant ist der Erwerb eines bestehenden Hofes in Fliseryds-Boda, Gemeinde Mönsterås, Schweden.

Die Immobilie umfasst:

- ca. 5,3 Hektar Grundstück
- bestehendes Hauptgebäude (stark sanierungsbedürftig)
- Ferienhaus (ca. 80 % fertiggestellt)
- Stall-/Scheunengebäude
- Nebengebäude
- große Freiflächen
- bestehende Zufahrt
- Stromanschluss
- Internetversorgung

Nicht vorhanden bzw. neu zu errichten:

- Brunnenanlage
- Abwasseranlage
- spätere touristische Infrastruktur

Das Projekt wird bewusst auf vorhandene Strukturen aufgebaut.

Ziel ist keine vollständige Neuerschließung, sondern eine wirtschaftlich sinnvolle Weiterentwicklung.

Standortanalyse – Warum dieser Ort geeignet ist

Der Standort bietet mehrere Eigenschaften, die für das Geschäftsmodell entscheidend sind.

Naturnahe Lage

Der Hof besitzt ausreichend Abstand und Offenheit, um:

- Ruhe zu ermöglichen
- kleine Veranstaltungen umzusetzen
- handwerkliche Tätigkeiten zu integrieren
- Übernachtungsangebote zu schaffen

Die Umgebung wirkt nicht überprägt.

Dadurch entsteht ein Umfeld, das Freiheit und Eigenständigkeit unterstützt.

Erreichbarkeit

Die vorhandene Zufahrt ermöglicht:

- private Anreise
- Materialtransport
- Winterbetrieb
- spätere Besucheranbindung

Die Wintererreichbarkeit wurde berücksichtigt.

Das verbessert die Ganzjahresfähigkeit erheblich.

Bestehende Gebäudestruktur

Die vorhandenen Gebäude reduzieren Entwicklungsrisiken.

Der Hof besitzt bereits:

- zentrale Orientierung
- Gebäudekörper
- Infrastrukturansätze
- funktionale Trennung

Dadurch kann schrittweise entwickelt werden.

Grundstücksanalyse – Die 5,3 Hektar

Die Fläche soll nicht vollständig bebaut werden.

Der Charakter des Ortes soll erhalten bleiben.

Die geplante Nutzung gliedert sich langfristig in Funktionsbereiche.



Standort- und Nutzungskonzept: Die 5,3 Hektar werden in Hofzentrum, Begegnungsbereich, Gästehäuser sowie Natur- und Ruheflächen gegliedert.

Das Nutzungskonzept zeigt bewusst keine Vollbebauung. Hofzentrum, Begegnung, Gästeaufenthalt und Ruheflächen bleiben unterscheidbar, damit der Ort wirtschaftlich nutzbar wird, ohne seinen Landschaftscharakter zu verlieren.

Gebäudeanalyse

Hauptgebäude

Aktueller Zustand:

stark renovierungsbedürftig.

Strategie:

Phase 1:

- Rückbau
- Freilegung der Struktur
- technische Bewertung

Danach Entscheidung:

- Sanierung
- Teilneubau
- Neubau

Langfristige Nutzung:

privates Wohnhaus.

Diese Entscheidung wird bewusst nicht vor Finanzierung getroffen.

Ferienhaus

Das Ferienhaus ist die wirtschaftlich wichtigste Immobilie der Startphase.

Status:

- ca. 80 % fertig

Fehlende Arbeiten:

- Dämmung
- Elektrik
- Sanitär
- Boden
- Wandflächen

Geschätzte Restkosten:

- 50.000 bis 70.000 SEK

Ziel:

- Fertigstellung innerhalb der ersten drei Monate

Funktion:

erste Einnahmequelle.

Scheune / Stall

Langfristige Nutzung:

- Stall
- Lager
- Landwirtschaft

Keine Eventnutzung geplant.

Nebengebäude

Nutzung noch offen.

Potenzial:

- Lager
- Technik
- Werkstatt
- spätere Ergänzungsfunktionen

Infrastrukturstrategie

Der Betrieb wird von Beginn an auf Endausbau vorbereitet.

Wasser

Neuer Brunnen.

Dimensionierung:

- Wohnhaus
- Ferienhaus
- Gästehäuser
- Sanitärhaus
- Backhaus
- Veranstaltungen

Abwasser

Neue Anlage.

Dimensionierung:

- langfristige Zielkapazität
- keine Zwischenlösung

Energie

Vorhandener Stromanschluss.

Strategie:

- bestehende Infrastruktur nutzen
- gezielt erweitern

Entwicklungsstrategie

Die Entwicklung erfolgt bewusst nicht gleichzeitig.

Phase 1

Kauf und Infrastruktur.

Priorität:

- Erwerb
- Brunnen
- Abwasser
- Ferienhaus

Ziel:

erste Einnahmen.

Phase 2

Rundhaus.

Ziel:

- Veranstaltungen
- Kurse
- Gemeinschaft

Phase 3

Backhaus und Schmiede.

Ziel:

- Tagesgäste
- Kursangebote

Phase 4

Gästehäuser.

Ziel:

- Übernachtungskapazität

Phase 5

Optimierung und Ausbau.

Bewertung aus Unternehmenssicht

Der Standort besitzt keine Stärke durch Luxus.

Die Stärke liegt in:

- vorhandenen Strukturen
- hoher Eigenleistung
- geringer Anfangskomplexität
- schrittweisem Wachstum
- klarer Identität

Die Immobilie wird nicht als Spekulationsobjekt verstanden.

Sie bildet die Grundlage für einen langfristig aufgebauten Betrieb.

Abschlussgedanke:

Der Hof soll nicht vollständig entwickelt wirken.

Er soll wachsen dürfen.

Nicht alles entsteht sofort.

Aber alles entsteht mit Richtung.

Teil 4 – Geschäftsmodell, Angebotsstruktur und Einnahmequellen

Geschäftsmodell – Was wird tatsächlich verkauft?

Der Hof verkauft nicht primär Übernachtungen.

Er verkauft auch nicht Kurse.

Und er verkauft nicht Veranstaltungen.

Der wirtschaftliche Kern des Projektes besteht darin, Menschen einen Ort zur Verfügung zu stellen, an dem sie:

- Natur erleben
- Freiheit spüren
- Fähigkeiten lernen
- Gemeinschaft freiwillig erleben
- Wissen teilen
- Zeit anders wahrnehmen

Die Einnahmen entstehen deshalb nicht aus einer einzelnen Quelle.

Das Geschäftsmodell basiert bewusst auf mehreren kleinen und mittleren Einnahmeströmen.

Dadurch entsteht langfristig Stabilität.

Grundstruktur des Geschäftsmodells

Das Projekt wird auf fünf wirtschaftliche Säulen aufgebaut.



Geschäftsmodell in fünf Säulen: Übernachtung, Kurse und Wissen, Handwerk und Verkauf, Veranstaltungen sowie Nutzung durch Dritte stabilisieren den Betrieb gemeinsam.

Säule 1 – Übernachtung

Ziel:

Grundauslastung und regelmäßige Einnahmen.

Angebote:

- Ferienhaus
- später 4 bis 5 Gästehäuser

Konzept:

- einfach
- hochwertig im Erlebnis
- kein Luxus
- naturnah
- familienfreundlich

Ausstattung:

- Heizung
- Wasser
- Strom
- kleine Kochmöglichkeit

Preisziel:

- ca. 600 bis 900 SEK pro Hütte / Nacht

Zielgruppe:

- Familien
- Paare
- Natururlauber
- Schwedenurlauber
- internationale Gäste

Besonderheit:

Die Gäste sollen frei entscheiden.

Es gibt kein Pflichtprogramm.

Säule 2 – Kurse und Wissensvermittlung

Ziel:

Ganzjährige Einnahmen.

Kursbereiche:

Eigene Angebote:

- Schmieden
- Backen
- Kochen
- Handwerk

Externe Angebote:

- Naturbildung
- Kreativangebote
- Gesundheitsangebote
- Kultur
- Familienangebote
- saisonale Kurse

Mögliche Erlösmodelle:

- Teilnahmegebühren
- Tageskarten
- Umsatzbeteiligung
- Raumnutzung
- Kooperationen

Besonderheit:

Nicht der Veranstalter steht im Mittelpunkt.

Sondern die Weitergabe von Wissen.

Säule 3 – Handwerk & Verkauf

Schmiede

Angebote:

- Einzelstücke
- Dekoration
- Werkzeuge
- Kunstobjekte
- Auftragsarbeiten

Vertrieb:

- Hofverkauf
- Veranstaltungen
- Onlineverkauf

Backhaus

Angebote:

- Brot
- saisonale Produkte
- Backtage
- Mitmachangebote

Vertrieb:

- Hofverkauf
- Veranstaltungstage

Langfristig:

kleine Lebensmittelproduktion.

Säule 4 – Veranstaltungen

Ziel:

Sichtbarkeit und zusätzliche Besucherströme.

Geplante Formate:

- Handwerkermärkte
- Weihnachtsmärkte
- Themenwochenenden
- Mittelaltertage
- Fantasyveranstaltungen
- kleine Hochzeiten
- saisonale Feste

Nicht vorgesehen:

- Großevents
- Festivalbetrieb
- Massenveranstaltungen

Grundsatz:

Qualität vor Größe.

Säule 5 – Ort zur Nutzung durch Dritte

Dies ist ein wesentlicher Bestandteil des Konzeptes.

Der Hof soll nicht nur eigene Angebote veranstalten.

Menschen sollen den Ort aktiv nutzen können.

Beispiele:

- Kursanbieter
- Künstler
- Handwerker
- Trainer
- Pädagogen
- Gemeinschaftsprojekte

Mögliche Modelle:

- Tagesmiete
- Beteiligung
- Kooperation
- gemeinsame Veranstaltungen

Dadurch entstehen Einnahmen ohne eigene Durchführung.

Wirtschaftliche Logik

Die Entwicklung folgt einer einfachen Reihenfolge:


- Übernachtung
- erste Einnahmen
- Rundhaus
- mehr Angebote
- höhere Aufenthaltsdauer
- mehr Kurse
- mehr Tagesgäste
- mehr Nachfrage

Jede neue Investition soll zusätzliche Nutzung erzeugen.

Keine Investition ohne Funktion.

Saisonstrategie

Der Betrieb soll nicht nur vom Sommer abhängig sein.

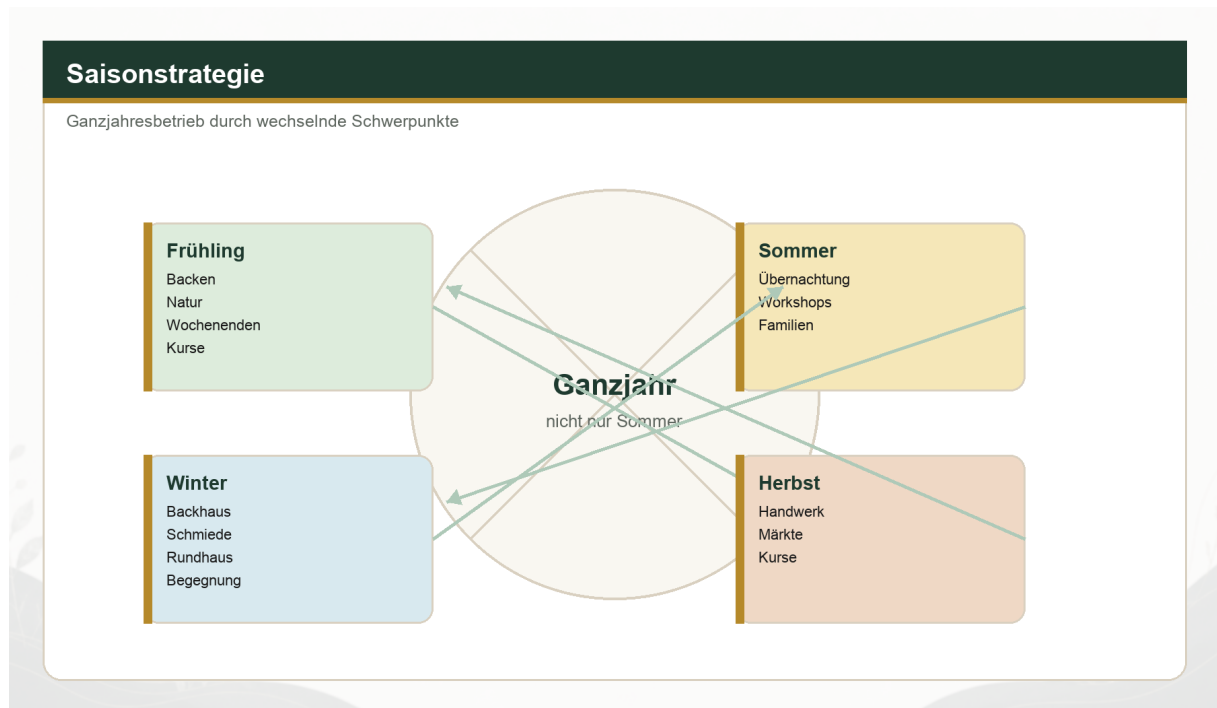

Saisonstrategie: Frühling, Sommer, Herbst und Winter erhalten unterschiedliche Angebotsschwerpunkte für einen robusteren Ganzjahresbetrieb.

Ganzjahresbetrieb ist ausdrücklich vorgesehen.

Zielgruppenstrategie

Nicht alle Gäste sollen gleich behandelt werden.

Der Ort soll verschiedene Bedürfnisse aufnehmen.

Gruppe A – Erholung

Suchen:

- Ruhe
- Natur
- Rückzug

Gruppe B – Erlebnis

Suchen:

- Handwerk
- Feuer
- Atmosphäre

Gruppe C – Lernen

Suchen:

- Kurse
- Austausch
- Entwicklung

Gruppe D – Region

Suchen:

- Gemeinschaft
- Aktivität
- Teilnahme

Abgrenzung – Was dieser Ort bewusst nicht ist

Der Hof wird bewusst nicht:

- Ferienpark
- Luxusresort
- Gastronomiebetrieb
- Eventhalle
- Museum
- Mittelalterkulisse
- Partyort

Er soll bleiben:

- lebendig
- offen
- naturnah
- ruhig
- echt

Langfristige wirtschaftliche Vision

Das Ziel ist nicht:

mehr Gäste.

Das Ziel ist:

- mehr Qualität pro Besuch
- mehr Aufenthalt
- mehr Verbindung
- mehr Weitergabe

Wirtschaftlicher Erfolg entsteht langfristig daraus, dass Menschen freiwillig zurückkommen.

Nicht weil sie müssen.

Sondern weil sie wollen.

Abschlussgedanke:

Menschen sollen den Ort nicht konsumieren.

Sie sollen ihn erleben.

Teil 5 – Zielgruppenanalyse, Positionierung und Marktstrategie

Grundsatz – Für wen entsteht dieser Ort?

Der Hof entsteht nicht für eine einzelne Zielgruppe.

Er wird bewusst so entwickelt, dass Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen denselben Ort auf unterschiedliche Weise erleben können.

Das verbindende Element ist nicht Alter, Herkunft oder Einkommen.

Es ist die Bereitschaft, sich auf Natur, Begegnung, Handwerk und Einfachheit einzulassen.

Der Ort richtet sich bewusst nicht an Menschen, die möglichst viel konsumieren möchten.

Er richtet sich an Menschen, die erleben möchten.

Positionierung des Projektes

Das Projekt positioniert sich zwischen mehreren Bereichen.

Nicht vollständig Tourismus.

Nicht vollständig Bildung.

Nicht vollständig Kultur.

Sondern als eigenständige Verbindung aus:

- naturnahem Aufenthalt
- Handwerk
- Wissensvermittlung
- Begegnung
- Kultur
- Freiheit
- entschleunigtem Erleben

Positionierung:

Naturnaher Erlebnis-, Bildungs- und Begegnungshof mit ganzjährigem Betrieb.

Hauptzielgruppen

Zielgruppe 1 – Familien

Motivation:

- gemeinsame Zeit
- Natur
- Abstand vom Alltag
- sinnvolle Aktivitäten

Gesuchte Erlebnisse:

- Backen
- Tiere
- Feuer
- Werkstätten
- Freiheit

Relevante Angebote:

- Gästehäuser
- Backhaus
- Rundhaus
- Naturflächen

Zielgruppe 2 – Paare

Motivation:

- Ruhe
- Zeit
- Einfachheit
- Verbindung

Gesuchte Erlebnisse:

- gemeinsames Erleben
- Rückzug
- Natur
- Lagerfeuer

Relevante Angebote:

- Hütten
- Aufenthaltsbereiche
- Winterbetrieb

Zielgruppe 3 – Handwerksinteressierte

Motivation:

- Fähigkeiten lernen
- praktische Erfahrung
- echte Materialien

Gesuchte Erlebnisse:

- Schmieden
- Bauen
- Kurse
- Austausch

Relevante Angebote:

- Schmiede
- Workshops
- externe Kursanbieter

Zielgruppe 4 – Natur- und Freiheitsorientierte

Motivation:

- Abstand
- Entschleunigung
- Naturerlebnis

Gesuchte Erlebnisse:

- einfache Umgebung
- Selbstbestimmung
- Ruhe

Relevante Angebote:

- Übernachtung
- Naturflächen
- Rundhaus

Zielgruppe 5 – Regionale Besucher

Diese Zielgruppe ist für das Projekt besonders wichtig.

Der Hof soll bewusst nicht ausschließlich für Reisende entstehen.

Menschen aus der Umgebung sollen:

- teilnehmen
- lernen
- Veranstaltungen besuchen
- selbst Angebote durchführen

Mögliche Nutzung:

- Backtage
- Märkte
- Kurse
- Werkstätten
- Begegnung

Zielgruppe 6 – Externe Kursanbieter

Dies ist eine eigenständige Zielgruppe.

Der Hof soll aktiv Menschen ansprechen, die Wissen weitergeben möchten.

Beispiele:

- Handwerker
- Künstler
- Naturpädagogen
- Trainer
- Familienangebote
- Kreative

Der Hof wird dadurch nicht nur Anbieter.

Er wird Infrastrukturgeber.

Internationale Ausrichtung

Das Projekt wird nicht auf eine Sprache begrenzt.

Zielgruppen:

- Schweden
- deutschsprachiger Raum
- internationale Gäste

Sprache wird nicht als Zugangshürde verstanden.

Der Schwerpunkt liegt auf:

- Atmosphäre
- Teilnahme
- Verständlichkeit durch Erlebnis

Preisstrategie

Der Hof soll bewusst zugänglich bleiben.

Nicht billig.

Aber erreichbar.

Übernachtung

Zielpreis:

- 600 bis 900 SEK pro Hütte pro Nacht

Positionierung:

erschwingliches Erlebnis.

Backkurse

Ziel:

- niedrige Einstiegshürde

Fokus:

- Teilnahme statt Exklusivität

Schmiedekurse

Start:

- Einsteigerangebote

Später:

- vertiefende Formate

Veranstaltungen

Grundsatz:

- klein halten
- nicht maximale Auslastung

Marketingstrategie

Marketing soll nicht auf künstlicher Inszenierung beruhen.

Menschen sollen sehen:

- echte Arbeit
- echte Entwicklung
- echte Begegnung

Geplante Kanäle:

- Social Media
- Website
- regionale Netzwerke
- Kooperationen
- Veranstaltungen
- Empfehlungen

Schwerpunkt:

Dokumentation statt Werbung.

Menschen sollen den Aufbau begleiten können.

Markenidentität

Der Ort soll folgende Gefühle auslösen:

- Freiheit
- Ruhe
- Echtheit
- Neugier
- Zugehörigkeit
- Vertrauen

Nicht:

- Konsum
- Zeitdruck
- Überforderung

Was Gäste später erzählen sollen

Nicht:

„Dort gab es viel.“

Sondern:

„Dort durfte ich einfach sein.“

Nicht:

„Es war perfekt.“

Sondern:

„Es war echt.“

Abschlussgedanke:

Menschen kommen wegen der Idee.

Sie bleiben wegen der Atmosphäre.

Sie kommen wieder wegen des Gefühls.

Teil 6 – Rechtliche Struktur, Genehmigungen und Umsetzung in Schweden

Grundsatz

Das Projekt wird in Schweden bewusst nicht als klassischer Ferienbetrieb entwickelt.

Geplant ist ein mehrstufig aufgebautes Betriebsmodell mit Elementen aus:

- Wohnen
- Beherbergung
- Handwerk
- Kursbetrieb
- Lebensmittelherstellung
- Kultur
- Veranstaltungen
- regionaler Begegnung

Die Kombination ist die größte Stärke des Projektes.

Sie erfordert eine strukturierte Genehmigungsstrategie.

Ziel:

- nicht alles gleichzeitig genehmigen
- Entwicklung in aufeinander aufbauenden Stufen

Ausgangslage der Immobilie

Bestand:

- Wohnhaus
- Ferienhaus
- Stall / Scheune
- Nebengebäude
- Freiflächen

Aktuelle Nutzung:

- Landwirtschaft

Geplante Nutzung:

- Wohnen
- Tourismus
- Handwerk
- Bildung
- Veranstaltungen

Das Projekt wird frühzeitig mit Behörden abgestimmt.

Empfohlene Unternehmensentwicklung

Phase 1 – Einzelunternehmen

Ziel:

- schneller Projektstart
- geringe Verwaltung
- geringe Anfangskosten

Nutzung:

- Vermietung
- Schmiede
- Backangebote
- erste Kurse

Phase 2 – Umwandlung in AB

Sobald:

- Vermietung wächst
- Mitarbeiter entstehen
- Veranstaltungen zunehmen
- Investitionen steigen

Gründe:

- Haftung
- Professionalisierung
- Finanzierung
- Wachstum

Baurechtliche Strategie

Prioritäten:

Stufe 1

- Ferienhaus fertigstellen

Stufe 2

- Wasser
- Abwasser

Dimensionierung:

- Wohnhaus
- Ferienhaus
- Gästehäuser
- Sanitärhaus
- Backhaus
- Tagesbetrieb

Stufe 3

- Rundhaus

Nutzung:

- Aufenthalt
- Kurse
- Begegnung
- Veranstaltungen

Stufe 4

- Gästehäuser

Wasser und Abwasser

Dies ist die zentrale technische Grundlage.

Die Entscheidung wurde bewusst getroffen:

- keine Zwischenlösung
- Endausbau direkt vorbereiten

Vorteile:

- weniger Umbauten
- Planungssicherheit
- bessere Erweiterbarkeit

Dimensionierung für:

- Wohnen
- Übernachtung
- Sanitär
- Kurse
- Tagesgäste

Wasser und Abwasser werden als Infrastrukturinvestition verstanden.

Nicht als Betriebskosten.

Backhaus – Lebensmittelrecht

Das Backhaus wird nicht als privater Hobbybereich betrieben.

Geplant:

- Kurse
- Produktion
- Verkauf
- externe Besucher

Daraus ergeben sich später:

- Lebensmittelhygiene
- Dokumentation
- Betriebsabläufe
- geeignete Räume

Der Fokus bleibt klein und regional.

Keine industrielle Produktion.

Schmiede – Sicherheit und Betrieb

Die Schmiede wird entwickelt als:

- eigenständige Einheit
- offen zugänglich
- mit Kursbetrieb

Geplant:

- offenes Feuer
- Gas
- Besucheraktivität

Berücksichtigt werden später:

- Sicherheitskonzepte
- Betriebsabläufe
- Besucherführung
- Versicherungsschutz

Die Schmiede ist Nebeneinkommen.

Nicht Hauptumsatzträger.

Veranstaltungen und externe Anbieter

Ein wesentlicher Bestandteil des Projektes ist die Öffnung des Ortes.

Später soll ermöglicht werden:

- externe Kurse
- Workshops
- kulturelle Angebote
- kleine Veranstaltungen

Grundsatz:

- kein Massentourismus
- keine Großveranstaltungen
- Qualität vor Menge
- Gemeinschaft vor Größe

Versicherungsstrategie

Bereits vorgesehen:

- Gebäudeversicherung
- Betriebsversicherung
- Veranstalterhaftung
- Produkthaftung
- Kursbetrieb
- Besucherabsicherung

Versicherung wird nicht als Zusatz verstanden.

Sondern als Betriebsgrundlage.

Risiko- und Genehmigungsstrategie

Das Projekt ist bewusst so aufgebaut, dass es auch bei verzögerten Genehmigungen fortgeführt werden kann.

Wenn spätere Bauphasen verschoben werden, laufen weiterhin:

- Vermietung
- Kurse
- Backhaus
- Schmiede
- Tagesbetrieb

Dadurch entsteht keine vollständige Abhängigkeit von einzelnen Entscheidungen.

Grundsatz für alle Entscheidungen

Jede neue Maßnahme muss drei Fragen erfüllen:

1. Erhöht sie die Nutzbarkeit?
2. Erzeugt sie langfristigen Wert?
3. Passt sie zur Identität des Ortes?

Nur wenn alle drei erfüllt sind, wird gebaut.

Abschlussgedanke:

Der Hof soll nicht schnell wachsen.


Er soll belastbar wachsen.

Teil 7 – Bauphasen, Investitionsplanung und Umsetzungsstrategie (Jahr 1–10)

Grundsatz der Entwicklung

Der Hof wird nicht vollständig finanziert, gebaut und eröffnet.

Er wird entwickelt.

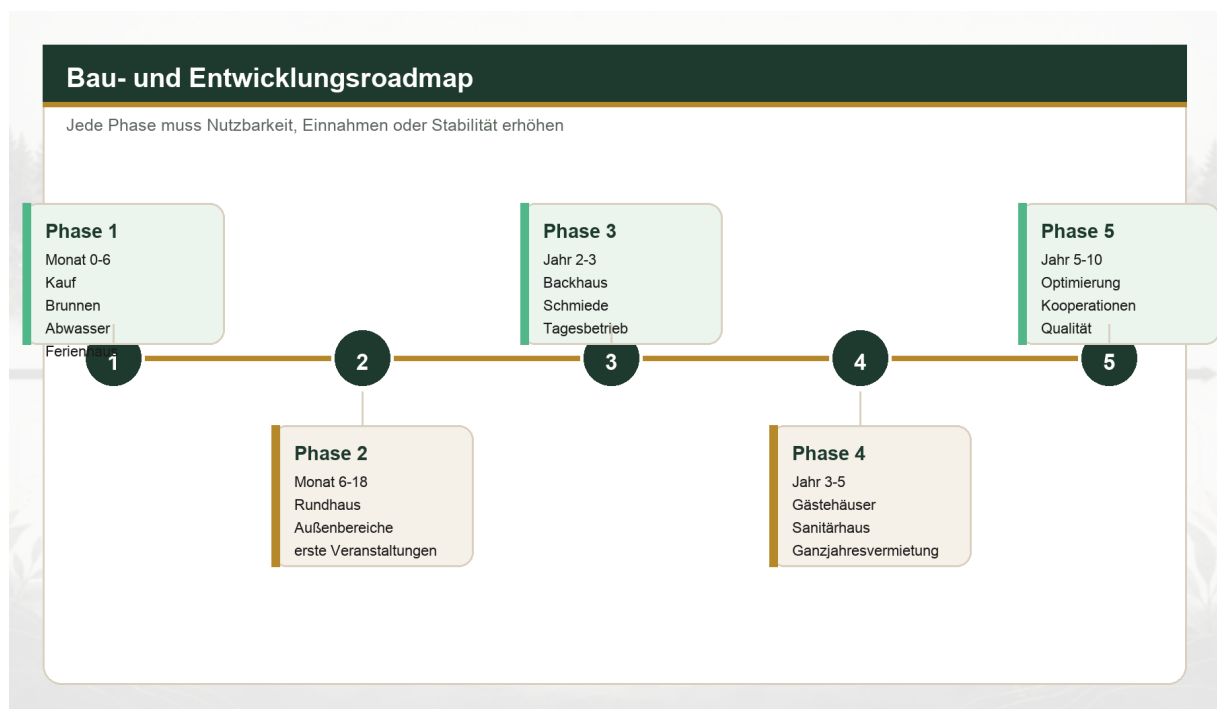

Bau- und Entwicklungsroadmap: Die Phasen führen von Kauf und Infrastruktur über Rundhaus, Backhaus, Schmiede und Gästehäuser bis zur Konsolidierung.

Die Grundstrategie lautet: zuerst Infrastruktur, dann Nutzbarkeit, dann Einnahmen und erst danach Ausbau. Jede Bauphase muss mindestens einen klaren Beitrag leisten: Einnahmen erzeugen, Betrieb ermöglichen, spätere Kosten reduzieren, Genehmigungsfähigkeit erhöhen oder Lebensqualität steigern.

Der Hof soll zu keinem Zeitpunkt wirtschaftlich von einer einzigen Maßnahme abhängig sein.

Investitionsstrategie

Gesamtrahmen erste Entwicklungsstufen:

ca. 3.000.000 SEK

Davon:

Kauf

- ca. 950.000 SEK

Infrastruktur

- Brunnen
- Abwasser
- Anschlüsse

Gebäude

- Ferienhaus
- Rundhaus
- erste Betriebsflächen

Reserven

- Genehmigungen
- unvorhergesehene Kosten

Phase 1 – Erwerb & Funktionsfähigkeit

Zeitraum: Monat 0 bis 6

Ziel

Grundstück übernehmen und erste wirtschaftliche Einheit schaffen.

Maßnahmen

Kauf des Hofes

Ziel:

- Besitz sichern

Infrastruktur schaffen

Umsetzung:

- Brunnen bohren
- Wasser anschließen
- Abwasser installieren
- Dimensionierung auf Endausbau

Ferienhaus fertigstellen

Restarbeiten:

- Dämmung
- Elektrik
- Sanitär
- Boden
- Wandflächen

Investition:

- 50.000 bis 70.000 SEK

Fertigstellung:

- erste 3 Monate

Betrieb vorbereiten

- Versicherungen
- erste Vermietung
- Onlinepräsenz
- einfache Buchbarkeit

Ergebnis Phase 1

Am Ende der Phase existiert:

- funktionsfähiger Hof
- Infrastruktur
- erste Einnahmequelle
- laufender Betrieb

Phase 2 – Rundhaus & Begegnung

Zeitraum: Monat 6 bis 18

Ziel

Einen Ort schaffen, an dem Menschen zusammenkommen.

Nicht Eventfläche.

Sondern Mittelpunkt.

Maßnahmen

Planung Rundhaus

Rahmendaten:

- 15 m Durchmesser
- Holzbau
- Feuerstelle
- Rauchfang
- kleine Küche
- Tische
- Bänke

Außenbereiche

- Wege
- Sitzflächen
- Aufenthaltsbereiche

Erste Veranstaltungen

Formate:

- kleine Workshops
- Backtage
- Schmiedetage
- Begegnungsabende

Ergebnis Phase 2

Am Ende der Phase:

- erster Veranstaltungsort
- Tagesgäste
- Kursfähigkeit

Phase 3 – Backhaus & Schmiede

Zeitraum: Jahr 2 bis 3

Ziel

Wissen und Handwerk wirtschaftlich nutzbar machen.

Backhaus

Umsetzung:

- Holzofen
- Kursbetrieb
- Produktion
- Verkauf

Angebote:

- Backkurse
- Brot
- Veranstaltungen

Schmiede

Umsetzung:

- Bau
- Feuer
- Sicherheitskonzept

Angebote:

- Kurse
- Verkauf
- Aufträge
- Onlinevertrieb

Ergebnis Phase 3

Am Ende der Phase:

- ganzjährige Angebote
- Tagesbetrieb
- zusätzliche Umsätze

Phase 4 – Gästehäuser

Zeitraum: Jahr 3 bis 5

Ziel

Aufenthaltsdauer und Kapazität erhöhen.

Umsetzung

Errichtung:

- 4 bis 5 Häuser

Ausstattung:

- Strom
- Wasser
- Dämmung
- Heizung

Kapazität:

- 10 bis 15 Gäste

Ergänzungen

- Sanitärhaus
- Wege
- Außenbereiche

Ergebnis Phase 4

Am Ende:

- Ganzjahresvermietung
- Mehrtagestourismus
- stabile Auslastung

Phase 5 – Konsolidierung & Wachstum

Zeitraum: Jahr 5 bis 10

Ziel

Keine Expansion.

Sondern Stabilität.

Maßnahmen

- Betriebsoptimierung
- Kooperationen
- externe Kursanbieter
- Mitarbeiter
- Qualität erhöhen

Optional

- weitere kleine Gebäude
- zusätzliche Werkstätten
- neue Angebote

Nur wenn wirtschaftlich sinnvoll.

Ergebnis Phase 5

Am Ende entsteht:

ein selbsttragender Hofbetrieb.

Investitionslogik

Nicht:

Kaufen, alles bauen, hoffen.

Sondern:

- Kaufen
- Infrastruktur
- Ferienhaus
- erste Einnahmen
- Rundhaus
- Kurse
- Backhaus + Schmiede
- Gästehäuser
- Wachstum

Umgang mit Risiken

Wenn Kosten steigen:

nicht stoppen.

Anpassen.

Mögliche Maßnahmen:

- Bauphasen verschieben
- extern arbeiten
- Einnahmen erhöhen
- Fördermittel ergänzen

Der Hof bleibt handlungsfähig.

Ziel nach 10 Jahren

Der Hof soll kein fertiges Projekt sein.

Sondern ein lebendiger Ort.

Ein Ort:

- an dem gearbeitet wird
- an dem Menschen lernen
- an dem Natur Raum hat
- an dem Gemeinschaft entstehen darf

Nicht maximal.

Sondern nachhaltig.

Abschlussgedanke:

Nicht alles wird gleichzeitig gebaut.

Aber alles wird mit Absicht gebaut.

Teil 8 – Finanzplanung, Wirtschaftlichkeit und bankfähige Kreditstrategie

Ziel der Finanzplanung

Die Finanzplanung verfolgt nicht das Ziel, ein maximales Wachstum darzustellen.

Ziel ist eine Finanzierung, die:

- realistisch umsetzbar ist
- ohne Eigenkapital tragfähig bleibt
- durch Eigenleistung abgesichert wird
- schrittweise entwickelt werden kann
- nicht vollständig von Tourismus abhängig ist

Das Projekt wird deshalb bewusst konservativ kalkuliert.


Ausgangslage

Bestehende Voraussetzungen:

- Wohnsitz in Schweden
- Personnummer vorhanden
- bestehendes Einkommen
- schwedischer Arbeitsvertrag (Anna)
- keine laufenden Kredite
- keine bekannten finanziellen Verpflichtungen
- Übergangswohnsituation vorhanden
- hohe Eigenleistung
- Maschinen vorhanden
- Fahrzeuge vorhanden
- Werkzeuge vorhanden

Diese Ausgangslage reduziert das Risiko gegenüber klassischen Neugründungen.

Finanzierungsmodell

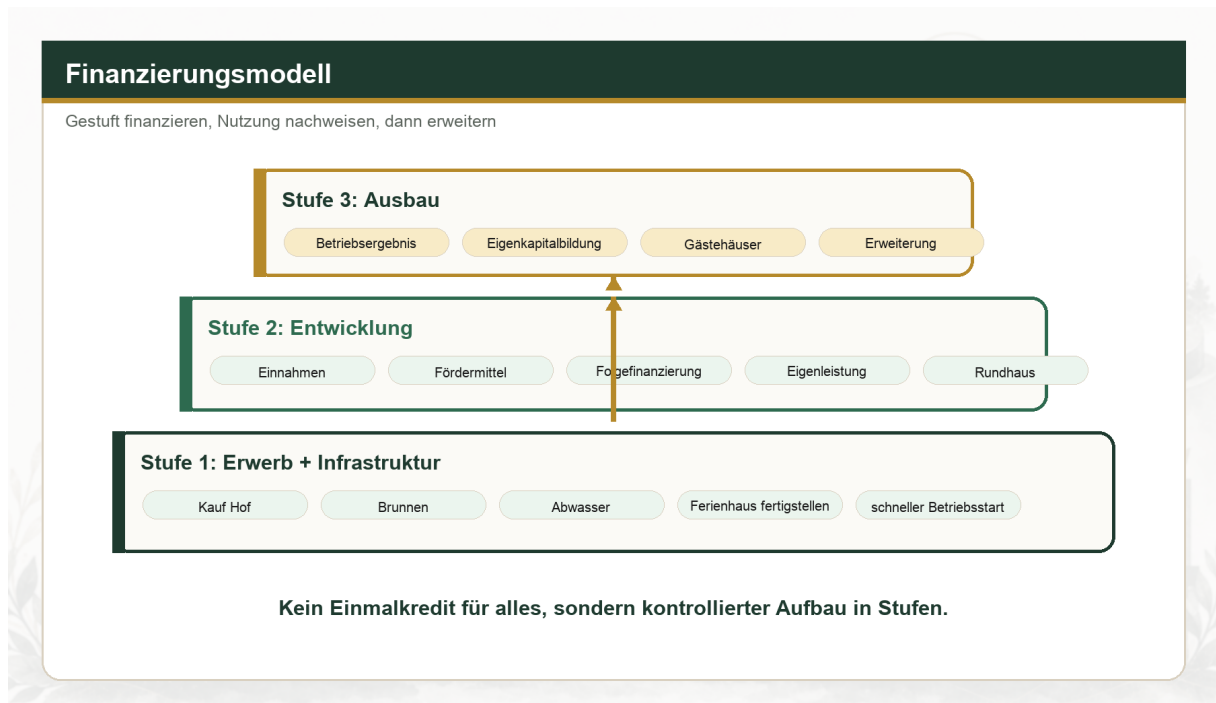

Finanzierungsmodell: Stufe 1 finanziert Erwerb und Infrastruktur, Stufe 2 entwickelt den Betrieb aus Einnahmen, Fördermitteln, Folgefanzierung und Eigenleistung, Stufe 3 erweitert erst nach nachweisbarer Tragfähigkeit.

Die Finanzierung wird nicht als einmaliger Vollausbau verstanden. Stufe 1 schafft Eigentum, Wasser, Abwasser und erste Vermietbarkeit. Stufe 2 wird durch Nutzungserfolge, Fördermöglichkeiten, Folgefanzierung und Eigenleistung getragen. Stufe 3 folgt erst, wenn Betriebsergebnis und Eigenkapitalbildung den Ausbau der Gästehäuser rechtfertigen.

Investitionsplanung (erste Entwicklungsstufen)

Bereich	Schätzung
Kauf Immobilie	950.000 SEK
Kaufnebenkosten / Reserven	100.000 SEK
Brunnen (Endausbau)	250.000 SEK
Abwasser (Endausbau)	350.000 SEK
Ferienhaus Fertigstellung	70.000 SEK
erste Außenanlagen	80.000 SEK
Genehmigungen / Rücklagen	100.000 SEK
Liquiditätspuffer	100.000 SEK

Erste Finanzierungsstufe:

≈ 2.000.000 SEK

Spätere Investitionen:

Bereich	Schätzung
Rundhaus	400.000 bis 700.000 SEK
Schmiede	150.000 bis 250.000 SEK
Backhaus	150.000 bis 250.000 SEK
Sanitärhaus	250.000 bis 400.000 SEK
Gästehäuser	600.000 bis 1.200.000 SEK

Gesamtentwicklung:

≈ 3.000.000 bis 4.500.000 SEK

(abhängig von Eigenleistung)

Eigenleistung als wirtschaftlicher Faktor

Die Eigenleistung ist ein zentraler Bestandteil.

Leistungsumfang:

- Rückbau
- Holzbau
- Innenausbau
- Oberflächen
- Gestaltung
- Infrastruktur
- Projektsteuerung

Nicht Eigenleistung:

- Elektrik
- Sanitär
- Fachabnahmen

Geplante Eigenleistung:

40 bis 60 Stunden/Woche.

Bankrelevanter Effekt:

Reduktion der Investitionskosten.

Einnahmen – Phase 1 (Jahr 1)

Ferienhaus

Annahme:

- 650 SEK/Nacht
- 160 Nächte

≈ 104.000 SEK

Backkurse

- 2 Kurse/Monat
- 6 Teilnehmer
- 300 SEK

≈ 43.000 SEK

Schmiedekurse

- 2 Kurse/Monat
- 4 Teilnehmer
- 600 SEK

≈ 58.000 SEK

Verkauf Backhaus + Schmiede

≈ 40.000 bis 60.000 SEK

Gesamt Jahr 1:

≈ 245.000 bis 265.000 SEK

ohne große Veranstaltungen.

Einnahmen – Phase 2–3 (Jahr 2–4)

Zusätzlich:

- Rundhaus
- Tagesgäste
- Märkte
- externe Anbieter

Schätzung:

≈ 400.000 bis 700.000 SEK/Jahr

Einnahmen – Zielbetrieb (Jahr 5–10)

Einnahmequellen:

- Übernachtung
- Kurse
- Backhaus
- Schmiede
- Verkauf
- Veranstaltungen
- Kooperationen

Konservative Zielgröße:

≈ 900.000 bis 1.600.000 SEK Umsatz/Jahr

ohne Massentourismus.

Kostenstruktur

Laufende Kosten:

- Strom
- Wasser
- Versicherungen
- Instandhaltung
- Lebensmittel
- Brennholz
- Buchhaltung
- Steuern
- Marketing

Grundsatz:

Fixkosten niedrig halten.

Liquiditätsstrategie

Falls Einnahmen langsamer entstehen:

1. Anna bleibt berufstätig
2. Robert arbeitet extern
3. Ausbau verschieben
4. Fördermittel aktivieren
5. Investitionen stufen

Dadurch bleibt das Projekt handlungsfähig.

Kreditstrategie (Bankversion)

Empfehlung:

Nicht 3 Mio. als Einmalkredit beantragen.

Sondern:

Kredit 1

Zweck:

- Erwerb + Infrastruktur

Umfang:

≈ 2 Mio.

Enthält:

- Kauf
- Brunnen
- Abwasser
- Ferienhaus
- Reserven

Kredit 2

Zweck:

- Rundhaus + Betriebsentwicklung

Nur nach Nachweis erster Nutzung.

Kredit 3

Zweck:

- Gästehäuser + Erweiterung

Erst bei stabilen Einnahmen.

Bankargumentation

Warum Finanzierung vertretbar ist:

- bestehendes Einkommen
- Wohnsituation gesichert
- keine Konsumschulden
- Eigenleistung
- vorhandene Maschinen
- bestehende Gebäude
- mehrfache Einnahmequellen
- organischer Ausbau

Das Projekt basiert nicht auf Hoffnung.

Es basiert auf Umsetzung.

Abschlussgedanke:

Der Hof muss nicht sofort alles tragen.

Er muss zuerst anfangen, sich selbst zu tragen.

Teil 9 – Risikoanalyse, Fördermöglichkeiten und Handlungssicherheit

Grundsatz

Jedes Projekt auf dem Land trägt Risiken.

Dieses Projekt unterscheidet sich jedoch in einem wichtigen Punkt:

Es basiert nicht auf maximalem Fremdkapital und schnellem Wachstum.

Es basiert auf:

- Eigenleistung
- schrittweisem Ausbau
- mehreren Einnahmequellen
- vorhandenen Fähigkeiten
- bewusst langsamer Entwicklung


Ziel ist deshalb nicht:

Risiken vermeiden.

Sondern Risiken beherrschbar machen.

Projektrisiken – Übersicht

Die Risiken werden nach Auswirkung und Steuerbarkeit betrachtet.

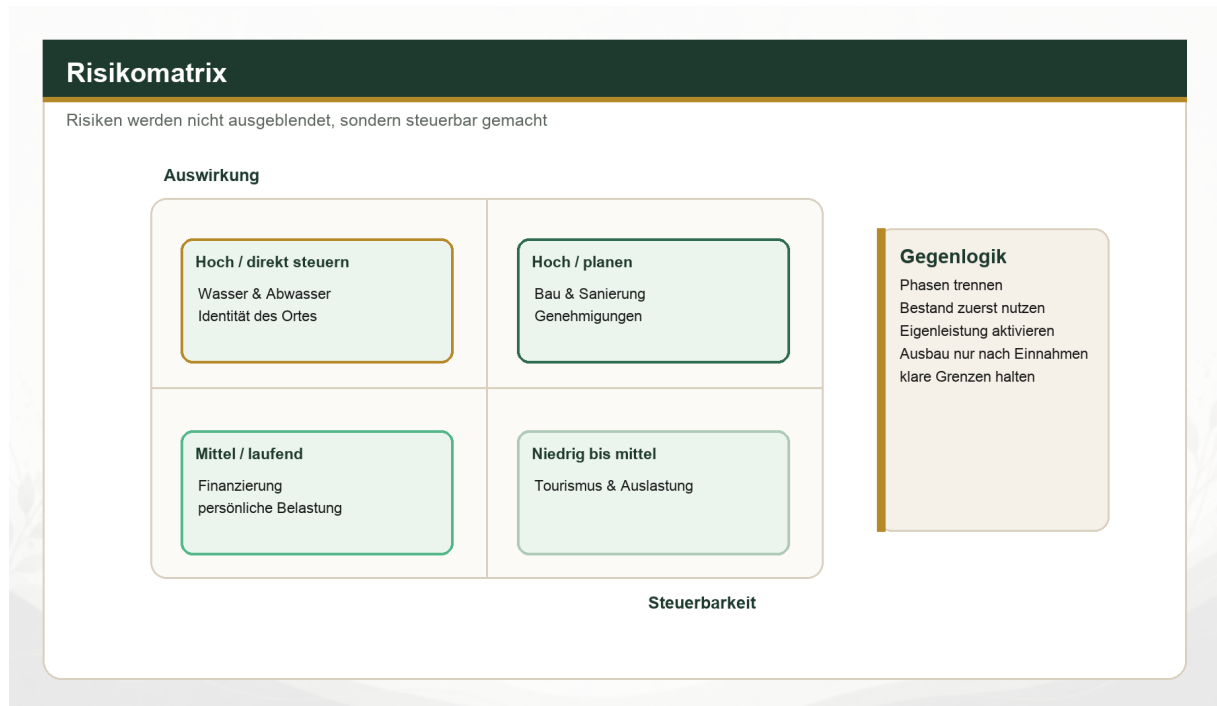

Risikomatrix: Finanzierung, Genehmigungen, Bau, Wasser und Abwasser, Tourismus, persönliche Belastung und Identitätsrisiko werden nach Auswirkung und Steuerbarkeit geordnet.

Finanzierungsrisiko

Risiko

- Kredit geringer als beantragt
- steigende Zinsen
- verzögerte Einnahmen

Auswirkungen

- spätere Bauphasen verschieben sich
- geringere Liquidität
- längerer Aufbau

Gegenmaßnahmen

- gestufte Finanzierung
- Anna bleibt berufstätig
- externe Arbeit von Robert möglich
- Ausbau nur nach Einnahmen
- Fördermittel nutzen

Bewertung

Mittel, gut steuerbar.

Genehmigungsrisiko

Risiko

Verzögerungen bei:

- Wasser
- Abwasser
- Rundhaus
- Gästehäuser
- Kursbetrieb
- Lebensmittelbereich

Auswirkungen

- spätere Eröffnung
- zeitliche Verschiebungen

Gegenmaßnahmen

- frühe Abstimmung
- Bauphasen trennen
- Bestand zuerst nutzen
- Infrastruktur früh herstellen

Bewertung

Mittel, planbar.

Bau- und Sanierungsrisiko

Risiko

- Hauptgebäude schlechter als erwartet
- zusätzliche Kosten
- Zeitverzug

Auswirkungen

- Neubau notwendig
- höhere Investitionen

Gegenmaßnahmen

- Rückbau zuerst
- Entscheidung erst nach Prüfung
- keine frühe Bindung

Bewertung

Mittel bis hoch, kontrollierbar.

Wasser- und Abwasserrisiko

Dies ist das größte technische Risiko.

Risiko

- Kosten höher als erwartet
- Leistung nicht ausreichend
- Genehmigungen verzögert

Auswirkungen

- spätere Nutzung
- verzögerter Ausbau

Gegenmaßnahmen

- Endausbau direkt planen
- Reserve einplanen
- Bauphasen flexibel halten

Bewertung

Hoch, höchste Priorität.

Tourismus- und Auslastungsrisiko

Risiko

- weniger Gäste
- schwache Saisons
- langsamer Aufbau

Auswirkungen

- geringere Einnahmen

Gegenmaßnahmen

Mehrere Standbeine:

- Vermietung
- Kurse
- Backhaus
- Schmiede
- Verkauf
- externe Anbieter

Bewertung

Niedrig bis mittel.

Persönliches Risiko

Risiko

- Überlastung
- zu hoher Anspruch
- zu wenig Erholung

Ausgangslage

Die Gründer bringen hohe Belastbarkeit mit.

Gleichzeitig ist bewusst:

Aufbaujahre sind intensive Jahre.

Gegenmaßnahmen

- Anna bleibt berufstätig
- Ausbau stufen
- externe Unterstützung zulassen
- Mitarbeiter langfristig einplanen

Bewertung

Mittel.

Risiko der Identitätsveränderung

Dies wird als strategisches Risiko betrachtet.

Risiko

- zu viele Gäste
- zu große Events
- zu schnelle Expansion
- Verlust der Atmosphäre

Auswirkungen

Verlust des eigentlichen Projektes.

Gegenmaßnahmen

Klare Grenzen:

- kein Massentourismus
- keine Großevents
- Qualität vor Menge
- Ausbau nur mit Sinn

Bewertung

Hoch, kulturell kritisch.

Fördermöglichkeiten (Strategische Betrachtung)

Das Projekt besitzt mehrere Eigenschaften, die grundsätzlich gut zu Förderlogiken passen.

Potenzielle Bereiche:

Ländliche Entwicklung

Mögliche Themen:

- Regionalentwicklung
- Begegnungsorte
- neue Wirtschaftsformen

Tourismusentwicklung

Mögliche Themen:

- naturnahe Angebote
- nachhaltiger Aufenthalt
- Ganzjahresbetrieb

Handwerk & Kultur

Mögliche Themen:

- Wissensvermittlung
- Handwerk
- Kurse

Kleinunternehmertum

Mögliche Themen:

- Aufbau
- Diversifizierung
- neue Einnahmequellen

Nachhaltigkeit

Mögliche Themen:

- Wiederverwendung
- langfristige Infrastruktur
- naturnahe Entwicklung

Handlungssicherheit

Der wichtigste Stabilitätsfaktor des Projektes:

Der Hof muss nicht sofort den Lebensunterhalt vollständig tragen.

Sicherheit entsteht durch:

- bestehendes Einkommen
- geringe Wohnkosten
- Eigenleistung
- flexible Entwicklung
- zusätzliche Arbeitsfähigkeit

Das reduziert Existenzdruck.

Drei Notfallstufen

Stufe 1 – Verzögerung

Maßnahme:

- Ferienhaus zuerst

Stufe 2 – Finanzierungslücke

Maßnahme:

- Robert arbeitet extern

Stufe 3 – Langsamer Markt

Maßnahme:

- mehr Kurse statt Bau

Gesamtbewertung

Das Projekt ist:

- nicht risikofrei
- robust
- anpassungsfähig
- mehrstufig
- wirtschaftlich nachvollziehbar

Die größte Stärke ist nicht Kapital.

Die größte Stärke ist die Fähigkeit der Gründer, den Ort selbst entwickeln zu können.

Abschlussgedanke:

Der Erfolg des Projektes hängt nicht davon ab, alles richtig vorherzusagen.

Er hängt davon ab, beweglich zu bleiben.

Teil 10 – Umsetzung, Markenaufbau, Marketing und 5-Jahres-Entwicklungsplan

Grundsatz

Dieses Projekt soll nicht eröffnet werden.

Es soll entstehen.

Der Aufbau des Hofes wird deshalb nicht als klassischer Projektabschluss verstanden, sondern als sichtbare Entwicklung.

Menschen sollen erleben können:

- wie ein Ort wächst
- wie Ideen entstehen
- wie Handwerk sichtbar wird
- wie Wissen geteilt wird

Der Aufbau selbst wird Teil der Identität.

Die Marke – Was Menschen erleben sollen

Der Hof soll nicht über Gebäude definiert werden.

Nicht über Größe.

Nicht über Luxus.

Sondern über ein Gefühl.

Die Marke entsteht aus fünf Elementen.

Freiheit

Menschen sollen nicht geführt werden.

Sie sollen wählen.

- teilnehmen
- beobachten
- lernen
- sich zurückziehen

Freiheit bedeutet nicht Leere.

Freiheit bedeutet Möglichkeiten.

Echtheit

Nicht perfekt.

Nicht inszeniert.

Sondern nachvollziehbar.

Menschen sollen sehen:

- Holz
- Feuer
- Arbeit
- Entwicklung
- echte Begegnung

Wissen

Wissen gehört nicht einzelnen Menschen.

Der Ort soll Austausch ermöglichen.

Nicht Belehrung.

Natur

Natur bleibt Umgebung und Bestandteil zugleich.

Nicht Dekoration.

Gemeinschaft

Gemeinschaft darf entstehen.

Sie wird nicht organisiert.

Markenversprechen

Der Hof verspricht nicht:

„Wir bieten alles.“

Sondern:

- Raum
- Möglichkeiten
- Begegnung
- Zeit
- Entwicklung

Menschen sollen nicht beschäftigt werden.

Sie sollen ankommen dürfen.

Kommunikationsstrategie

Die Kommunikation folgt einem einfachen Prinzip:

Nicht verkaufen.

Sondern zeigen.

Menschen sollen erleben:

- wie gebaut wird
- wie gelernt wird
- wie der Ort entsteht

Inhaltliche Schwerpunkte

Aufbau

- Renovierung
- Eigenleistung
- Entscheidungen

Handwerk

- Schmiede
- Holzbau
- Gestaltung

Backhaus

- Kurse
- Brot
- Entwicklung

Alltag

- Tiere
- Jahreszeiten
- Hofleben

Menschen

- Begegnungen
- Kurse
- Geschichten


Social-Media-Strategie

Social Media wird als Dokumentation verstanden.

Nicht als Werbung.

Ziel:

Vertrauen aufbauen.

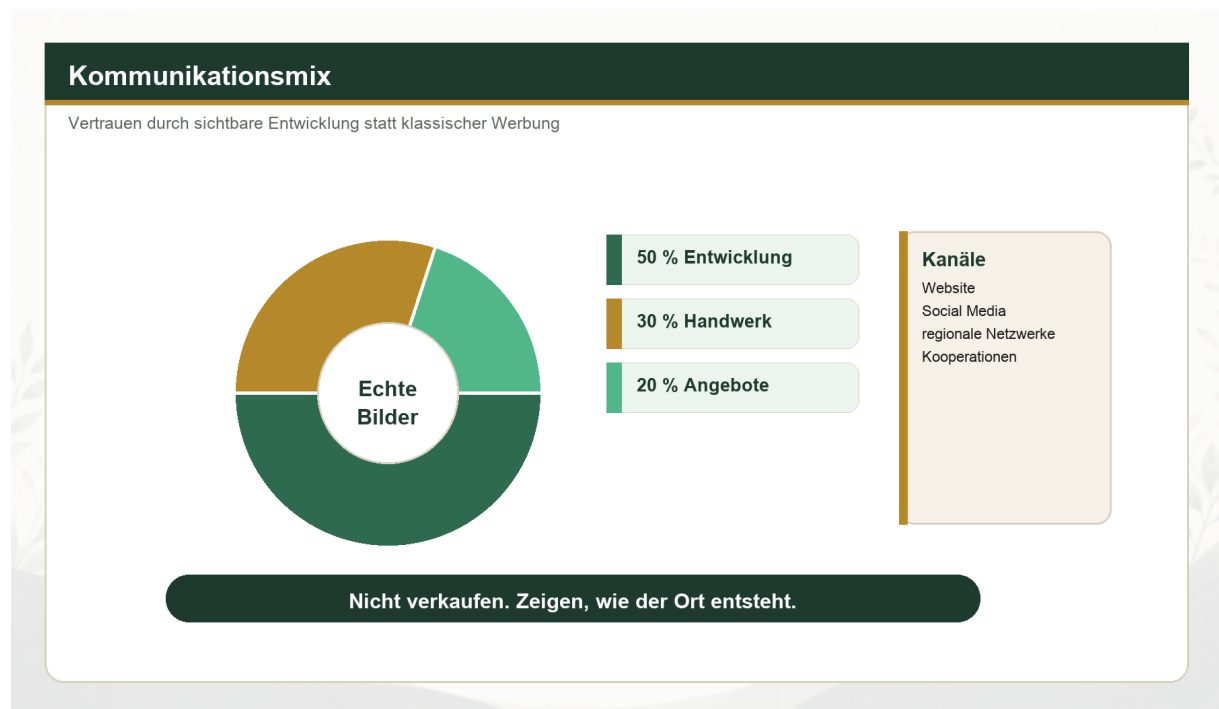

Kommunikationsmix: Etwa 50 Prozent Entwicklung, 30 Prozent Handwerk und 20 Prozent Angebote werden über Website, Social Media, regionale Netzwerke und Kooperationen sichtbar gemacht.

Regel:

Lieber echte Bilder.

Weniger perfekte Bilder.

Kooperationen

Der Hof soll langfristig kein isolierter Betrieb sein.

Mögliche Partner:

- externe Kursanbieter
- regionale Produzenten
- Handwerker
- Vereine
- Künstler
- Naturangebote
- Schulen
- kulturelle Initiativen

Kooperationen sollen das Angebot erweitern.


Nicht ersetzen.

Gästereise (idealer Ablauf)

Der Ort soll keine feste Dramaturgie erzwingen.

Menschen entscheiden selbst.

Trotzdem entsteht eine natürliche Reise.

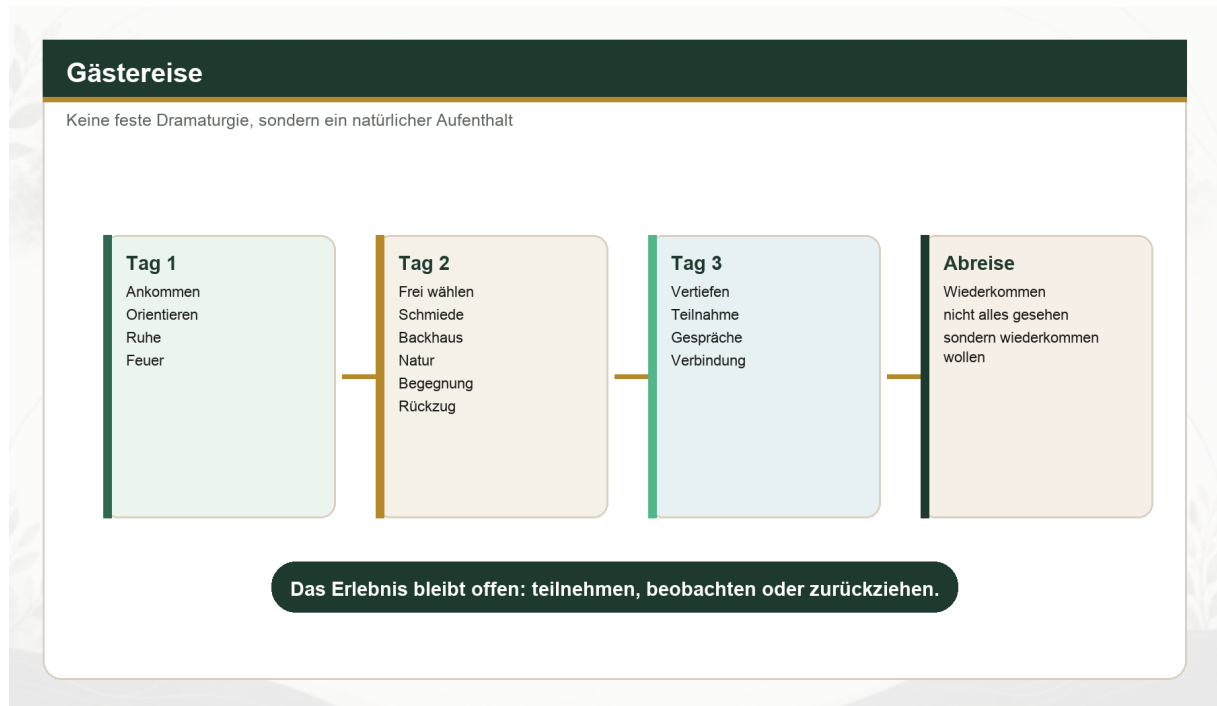

Gästereise: Der Aufenthalt führt von Ankommen und Orientierung über freie Wahl und Vertiefung bis zum Gefühl, wiederkommen zu wollen.

Der Aufbau als Entwicklungsreise (5 Jahre)

Jahr 1

Ziel:

Funktionsfähigkeit.

Ergebnis:

- Kauf
- Infrastruktur
- Ferienhaus
- erste Gäste

Jahr 2

Ziel:

Gemeinschaft.

Ergebnis:

- Rundhaus
- erste Veranstaltungen
- Kursbetrieb

Jahr 3

Ziel:

Wissen.

Ergebnis:

- Backhaus
- Schmiede
- externe Anbieter

Jahr 4

Ziel:

Aufenthalt.

Ergebnis:

- erste Gästehäuser
- Winterangebote

Jahr 5

Ziel:

Stabilität.

Ergebnis:

- wiederkehrende Gäste
- regionale Verankerung
- erste Mitarbeiter

Erfolgsmessung

Erfolg wird nicht nur über Umsatz bewertet.

Zusätzliche Kennzahlen:

- Rückkehrquote
- Kursauslastung
- Aufenthaltsdauer
- Anteil regionaler Besucher
- Wiederbuchungen
- Kooperationen
- persönliche Lebensqualität

Langfristiges Bild

Der Hof soll in fünf Jahren nicht fertig sein.

Aber er soll sichtbar geworden sein.

Menschen sollen erkennen:

Hier entsteht etwas.

Langsam.

Ehrlich.

Mit Haltung.

Und mit Raum für andere.

Abschlussgedanke:

Der Ort soll nicht größer werden als seine Werte.

Er soll mit ihnen wachsen.

Teil 11 – Langfristige Vision, Lebensmodell und Schlussbetrachtung

Warum dieses Projekt entsteht

Dieses Projekt entstand nicht aus dem Wunsch, auszusteigen.

Es entstand aus dem Wunsch, anders aufzubauen.

Nicht schneller.

Nicht größer.

Sondern näher an dem, was für die Gründer langfristig ein gutes Leben bedeutet.

Der Hof soll kein Objekt werden.

Er soll ein Ort werden.

Ein Ort, an dem Leben, Arbeit, Begegnung und Entwicklung zusammenfinden dürfen.

Das langfristige Lebensmodell

Das Ziel ist nicht, möglichst viele Gebäude zu errichten.

Das Ziel ist nicht, möglichst viele Gäste zu gewinnen.

Und auch nicht, einen maximalen wirtschaftlichen Ertrag zu erzeugen.

Das langfristige Ziel ist:

Ein Leben zu schaffen, das tragfähig ist.

Ein Alltag, der:

- wirtschaftlich funktioniert
- Freude macht
- Freiheit zulässt
- Gemeinschaft ermöglicht
- Entwicklung offen hält

Der Hof soll deshalb nicht nur Einkommen erzeugen.

Er soll Lebensqualität erzeugen.

Die Rolle der Arbeit

Arbeit wird in diesem Projekt nicht als Gegensatz zum Leben verstanden.

Arbeit ist Teil des Lebens.

Deshalb entstehen Angebote nicht aus Marktlogik allein.

Sie entstehen aus Fähigkeiten, Interessen und dem Wunsch, diese mit anderen Menschen zu teilen.

Langfristig soll entstehen:

- Handwerk
- Bildung
- Gastfreundschaft
- Begegnung
- Kultur
- Naturerleben

Nicht als getrennte Bereiche.

Sondern als zusammenhängender Alltag.

Die Rolle der Familie

Der Hof wird als Familienprojekt aufgebaut.

Die Rollen sind bewusst verteilt.

Robert Walter:

- Entwicklung
- Bau
- Infrastruktur
- Schmiede
- Projektsteuerung

Anna Walter:

- Backhaus
- Lebensmittel
- Kurse
- Gastfreundschaft
- Organisation

In der Aufbauphase bleibt die bestehende berufliche Stabilität bewusst erhalten.

Dadurch entsteht Entwicklung ohne unnötigen Druck.

Die Rolle der Gäste

Gäste werden nicht als Auslastung betrachtet.

Sie sind Teil des Ortes.

Der Hof soll Menschen nicht unterhalten.

Er soll ihnen Möglichkeiten geben.

Menschen sollen:

- teilnehmen
- beobachten
- lernen
- gestalten
- sich zurückziehen

Es gibt keinen Zwang zur Aktivität.

Und keinen Zwang zur Gemeinschaft.

Beides darf entstehen.

Die Rolle der Region

Der Hof soll nicht isoliert bestehen.

Er soll Teil seines Umfeldes werden.

Langfristig soll entstehen:

- Zusammenarbeit
- Offenheit
- regionale Verbindung
- Austausch
- gegenseitige Unterstützung

Der Ort soll nicht neben der Region existieren.

Sondern mit ihr.

Langfristige Entwicklung des Betriebes

Mögliche spätere Entwicklungen:

- zusätzliche Kursangebote
- neue Kooperationen
- weitere kleine Gebäude
- Mitarbeiter
- neue handwerkliche Angebote
- zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten

Diese Entwicklungen erfolgen jedoch nur unter einer Bedingung:

Der Charakter des Ortes muss erhalten bleiben.

Grenzen des Wachstums

Das Projekt verfolgt bewusst keine unbegrenzte Expansion.

Nicht jede Nachfrage wird angenommen.

Nicht jede Möglichkeit wird umgesetzt.

Entscheidungsgrundlagen:

- passt es zum Ort?
- verbessert es die Qualität?
- bleibt die Freiheit erhalten?

Nur wenn diese Fragen beantwortet werden können, erfolgt Wachstum.

Erfolg – Wie Erfolg definiert wird

Erfolg bedeutet nicht:

- maximale Auslastung
- größtmöglicher Umsatz
- größtmögliche Bekanntheit

Erfolg bedeutet:

- dort leben zu können
- die Familie versorgen zu können
- Freude an der Arbeit zu haben
- Menschen willkommen zu heißen
- Wissen weiterzugeben
- Zeit sinnvoll zu nutzen

Das Bild nach zehn Jahren

In zehn Jahren soll ein Hof entstanden sein:

- der wirtschaftlich funktioniert
- der weiter wachsen darf
- der genutzt wird
- der Menschen verbindet
- der Wissen weitergibt
- der Natur respektiert
- der Freude macht

Ein Ort, an dem Familie, Gäste und Arbeit nicht gegeneinander stehen.

Sondern miteinander.

Schlusswort

Dieses Projekt ist kein fertiges Konzept.

Es ist eine Richtung.

Die wirtschaftlichen Zahlen schaffen die Grundlage.

Die Gebäude schaffen den Raum.

Aber die eigentliche Qualität entsteht durch das, was dort täglich gelebt wird.

Der Hof soll nicht perfekt werden.

Er soll echt werden.

Und genau darin liegt seine Stärke.

Anhang

Anhang A – Finanzübersicht

Bereich	Schätzung	Bemerkung
Kauf	950.000 SEK	Grundstück / Hofanlage
Brunnen + Abwasser	600.000 SEK	Endausbau
Ferienhaus	70.000 SEK	Fertigstellung
erste Außenanlagen	80.000 SEK	Wege, Aufenthaltsflächen
Genehmigungen / Rücklagen	100.000 SEK	Planungs- und Behördenpuffer
Liquiditätspuffer	100.000 SEK	Startreserve
Reserve	380.000 SEK	Puffer für Unvorhergesehenes

Anhang B – Investitionsübersicht

Stufe 1 – Kauf + Infrastruktur

- Kauf der Hofanlage
- Brunnenbohrung
- Abwasseranlage
- Fertigstellung Ferienhaus
- Versicherungen
- erste Onlinepräsenz
- einfache Buchbarkeit

Stufe 2 – Rundhaus

- Planung
- Holzbau
- Feuerstelle mit Rauchfang
- kleine Küche
- Tische und Bänke
- Außenbereiche

Stufe 3 – Backhaus + Schmiede

- Backhaus mit Holzofen
- Kursbetrieb
- Produktion und Verkauf
- Schmiede mit offenem Feuer und Gas
- Sicherheitskonzept
- Verkauf und Onlinevertrieb

Stufe 4 – Gästehäuser

- 4 bis 5 Gästehäuser
- Sanitärhaus
- Wege
- Außenbereiche
- Wintertauglichkeit

Stufe 5 – Konsolidierung

- Kooperationen
- externe Kursanbieter
- Mitarbeiter
- Qualitätsentwicklung
- zusätzliche Angebote nur bei wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit

Anhang C – Zeitplan

Zeitraum	Schwerpunkt	Ergebnis
Monat 0 bis 3	Ferienhaus abschließen	erste Vermietbarkeit
Monat 3 bis 6	Brunnen und Abwasser	Infrastrukturgrundlage
Monat 6 bis 18	Rundhaus	Begegnungs- und Kursort
Jahr 2 bis 3	Backhaus und Schmiede	ganzjährige Angebote
Jahr 3 bis 5	Gästehäuser	Übernachtungsausbau
Jahr 5 bis 10	Konsolidierung	stabiler Hofbetrieb

Anhang D – Grundrissidee / Funktionsbereiche

Hofzentrum

- Wohnhaus
- Ferienhaus
- Scheune
- Nebengebäude
- Lager
- Versorgung

Begegnungsbereich

- Rundhaus
- Aufenthaltsflächen
- Wege
- gemeinschaftliche Außenbereiche

Gästebereich

- 4 bis 5 Gästehäuser
- Sanitärhaus
- naturnahe Platzierung
- Rückzugsmöglichkeiten

Handwerksbereich

- Schmiede separat
- sichere Besucherführung
- Lager für Material
- Kursflächen

Backhausbereich

- Backhaus mit Holzofen
- Kurs- und Produktionsbereich
- kleiner Hofverkauf

Natur- und Ruheflächen

- extensiv genutzte Flächen
- Tiere
- Spazierwege
- Rückzugsbereiche

Anhang E – Organigramm

Robert Walter

- Entwicklung
- Bau
- Infrastruktur
- Schmiede
- Projektsteuerung
- externe Arbeiten bei Bedarf

Anna Walter

- Backhaus
- Lebensmittel
- Kurse
- Gästebetreuung
- Organisation
- bestehende berufliche Stabilität in der Aufbauphase

Externe Fachkräfte

- Elektrik
- Sanitär
- Fachabnahmen
- bei Bedarf Bau- und Genehmigungsberatung

Spätere Erweiterung

- externe Kursanbieter
- saisonale Helfer
- Mitarbeiter
- Kooperationspartner

Ende des Businessplans
